

MINUTA DE OBRAS

OBRA **ILUMINACIÓN PARADEROS PUENTES 1 AL 5 RUTA 148**
SECTOR **PUENTES DEL 1 AL 5, RUTA 148**

INSPECCION TECNICA -

Unidad Técnica SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
I.T.O. AUGUSTO ALARCÓN COLOMA
Profesión INGENIERO E. EN ELECTRICIDAD

LICITACION

ID propuesta www.mercadopublico.cl 4988-31-LE22

CONTRATO ORIGINAL

Empresa Constructora INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA SINEC S.A.
Financia MUNICIPAL
Monto Aprobado \$ 59.254.457
Monto Adjudicado \$ **39.379.111** del 21/12/2022
Acta de Entrega de terreno 20/02/2023
Plazo de Ejecución 60 días corridos
Fecha de Terminó 21/04/2023

MODIFICACION DE CONTRATO

Aumento de Obras
Aumento de Plazo
Monto Total Inversión
Plazo Total aumentado
Fecha de Real

RECEPCION DE OBRA

Acta de Recepción Provisoria **13/06/2023**
Decreto de Recepción provisoria 56-SDC-23 del 14/06/2023

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las obras consisten en el mejoramiento de Alumbrado público Vial para distintos puntos en ruta 148 camino Concepción Florida, con el objetivo de otorgar mayor seguridad a 13 sectores con afluencia de personas en paraderos existentes, y en la vía de tránsito vehicular donde se encuentran viviendas cercanas a la ruta, que incluye la provisión e instalación de 71 luminarias viales de tecnología Led de 90W y 120W, con sus respectivos ganchos y elementos de fijación y conexión, tendido aéreo de 3277ml de conductor aéreo, postes de hormigón, mallas a tierra.



MODIFICACION DE OBRA

No se consultaron modificaciones.

AUGUSTO ALARCÓN COLOMA
SUDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES
ITO DE OBRA

Concepción, 16 de septiembre 2024

FOTOGRAFIAS

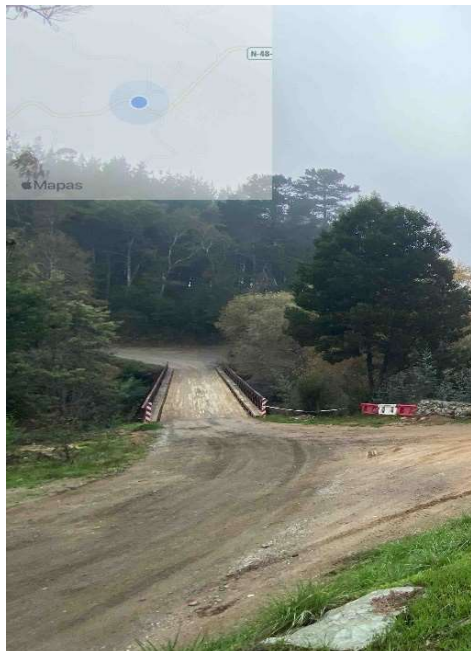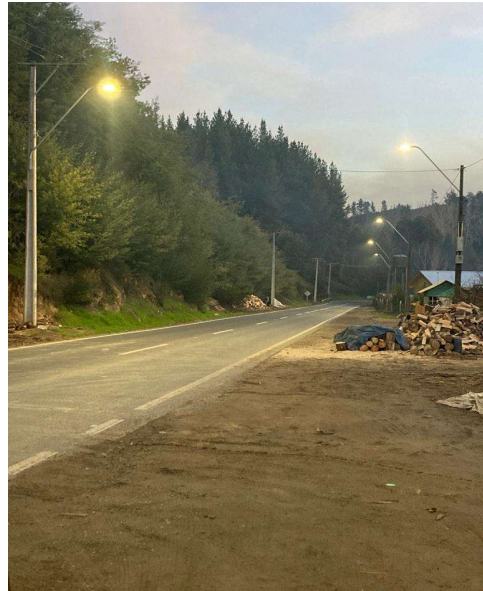

FOTOGRAFIAS
